27/11/2015

RELAZIONE MONTAGGIO CUCINA SCAVOLINI - MODELLO LIBERAMENTE

Premessa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare alcuni particolari del montaggio della cucina Scavolini modello Liberamente presso la mia abitazione, e capire se il lavoro è stato eseguito rispettando i canoni della regola dell'arte.
Non avendo alcuna esperienza in materia di montaggio di cucine, voglio mettere in evidenza alcuni aspetti che mi lasciano delle perplessità, e che vorrei mi fossero chiariti, confermando o meno la correttezza dell'esecuzione del lavoro.
Queste osservazioni vengono fatte dopo il montaggio della cucina e una seconda uscita degli operai per sostituire il pensile ad angolo con evidenti vizi (la porta non chiudeva ed il ripiano non combaciava).
Sono pienamente disponibile ad un confronto e ad essere smentito se le mie osservazioni dovessero essere troppo pignole e se le operazioni rispettano pienamente il modus operandi di Scavolini.

Elenco problematiche

Le problematiche riscontrate più importanti sono evidenziate in grassetto, le altre sono problematiche marginali, che secondo il mio punto di vista, vogliono essere una critica costruttiva a Scavolini in primis, ma anche al negozio rivenditore per poter migliorare in futuro e non perdere clienti, come nel mio caso.

Osservazioni pre-montaggio cucina (Responsabilità: Mobilificio):

1) Disegno tecnico per scarichi e prese;
2) Mancata assistenza su problema cappa;

Osservazioni montaggio cucina (Responsabilità: Mobilificio):

3) Scansi sui pensili fatti in opera; (Responsabilità anche di Scavolini se conferma modalità)
4) Scansi per fissaggio lavello e passaggio prese;
5) Angolo gole;
6) Forno a microonde storto;
7) Pulizia;
8) Fessura su lavandino;
9) Fessura su angolo schienale quartz;

Osservazioni generali (Responsabilità: Scavolini):

10) Forno a microonde con pulsante non centrato;
11) Sottoripiano in quartz a vista;
12) Griglia scolapiatti non si incastra;
13) Pannello retrostante di dubbia consistenza;

Esplicazione osservazioni pre-montaggio cucina

1) Disegno tecnico per scarichi e prese

Al momento dell'ordine della cucina, addirittura prima della firma del preliminare, mi è stato fornito il disegno tecnico con l'esatta posizione di scarichi e prese.

Tralasciando il fatto che per me i disegni tecnici sono tutt'altra cosa, riporto i fogli che mi sono stati forniti:

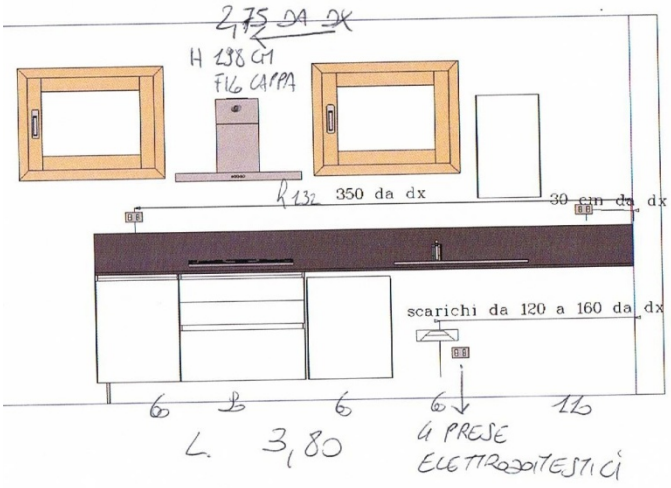

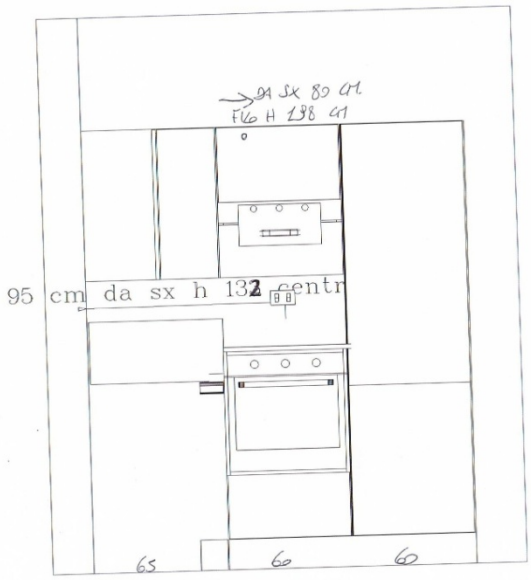

Il problema che si è creato è stato relativamente alle prese, non gli scarichi, sotto al lavandino.

Non si capisce, ma si può solo intuire a quale misure piazzarle, ed in effetti in cantiere è stata sbagliata la misura. La conseguenza è che si è dovuto ritagliare il fianco di un pensile come si evince nella figura sottostante.

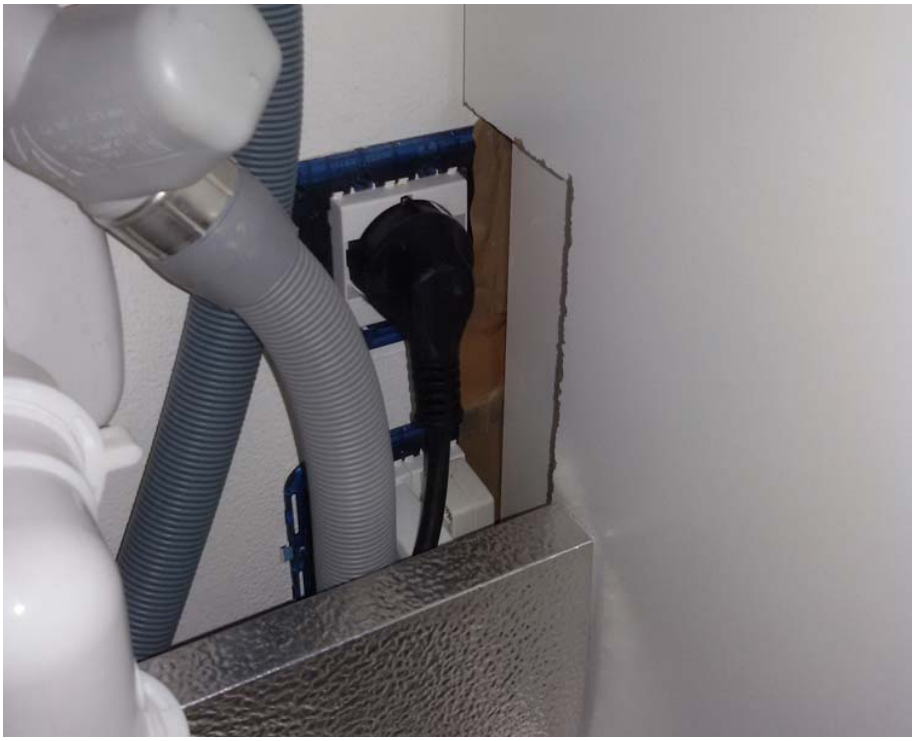

2) Mancata assistenza su problema fissaggio cappa

Al momento del primo rilievo in cantiere è stato segnalato dal costruttore che dove doveva essere fissata la cappa passava esattamente la colonna di scarico dei bagni.

Dal costruttore stesso è stata suggerita la soluzione di costruire una piastra da ancorare al muro sotto l'intonaco, facendo uscire degli agganci dove doveva essere fissata la cappa, senza così dover rischiare di forare la colonna di scarico dei bagni.

La soluzione è stata recepita dal mobilificio che mi ha sempre rassicurato sulla loro fornitura di tale piastra.

Nonostante i 2 mesi di tempo, sono riuscito ad avere la piastra la sera prima della posa dell'intonaco, ma la cosa più grave è che era una semplice barra per l'aggancio delle cucine da 25 cm.

Purtroppo non è stato capito il concetto, in quanto se io annegavo nell'intonaco tale barra, spariva e non serviva a nulla.

Ho risolto costruendomi la barra la sera stessa a casa.

Senza tale accorgimento non sarebbe stato possibile fissare la cappa.

Esplicazione osservazioni montaggio cucina

3) Scansi sui pensili fatti in opera

Per montare i pensili della cucina sulla barra di aggancio al muro, sono stati fatti in opera degli scansi nei fianchi interni dei pensili con seghetto alternativo, cacciavite e martello.

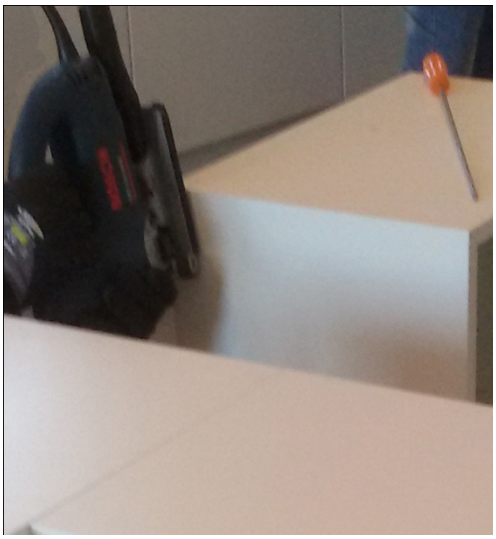

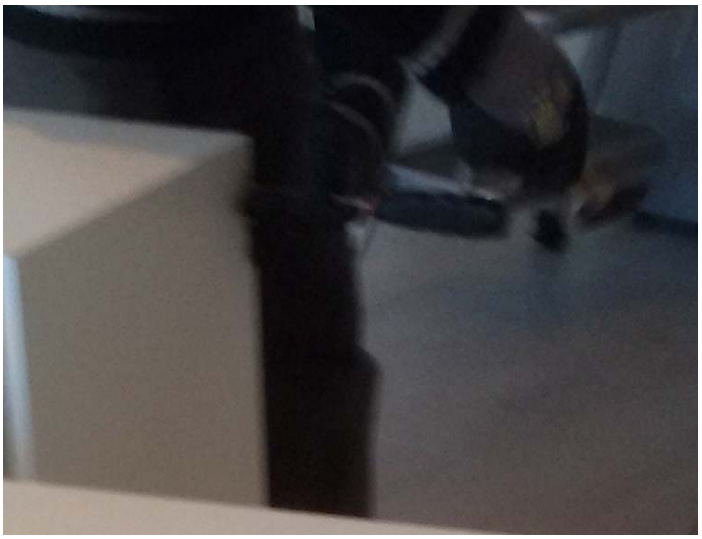

Questo il lavoro finito su un pensile, sono stati ritagliati 4 fianchi.

Questo lavoro per evitare di vedere la fessura tra pensile e muro, che comunque si è formata.

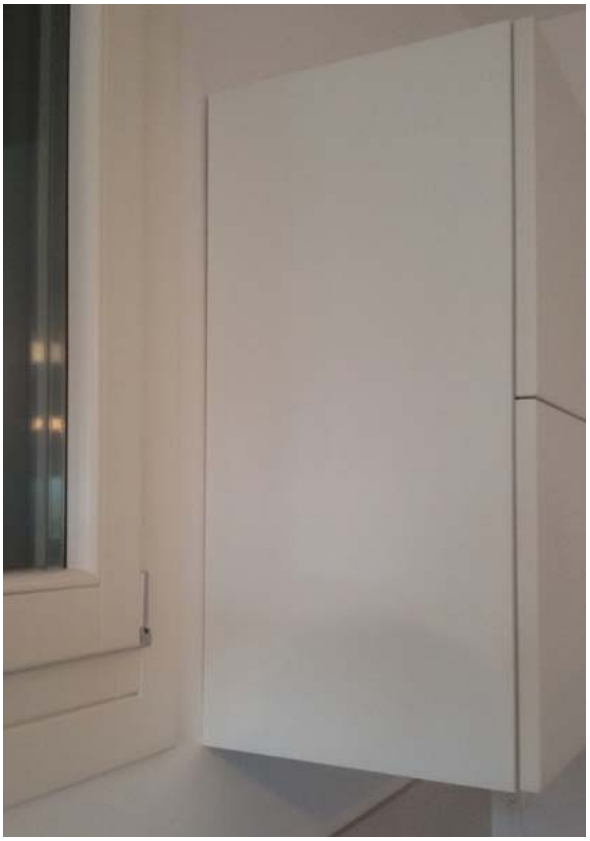

Le perplessità che mi vengono sono queste:

A) E' la procedura corretta?
B) Non esiste la possibilità di fare questo lavoro in fabbrica per evitare che gli operai facciano queste operazioni in cantiere?
C) Ho il timore che con il passare degli anni su queste parti rimaste non verniciate, possa insinuarsi l'umidità e gonfiarsi.

4) Scansi per fissaggio lavello e passaggio prese

Per il fissaggio dello scivolo del lavandino è stato creato, sempre in opera, uno scanso che dovrebbe permettere l'aggancio dello scivolo stesso, aggancio che comunque non è stato fissato.
E stato creato un altro scanso per permettere di inserire le prese, la causa al punto n° 1.

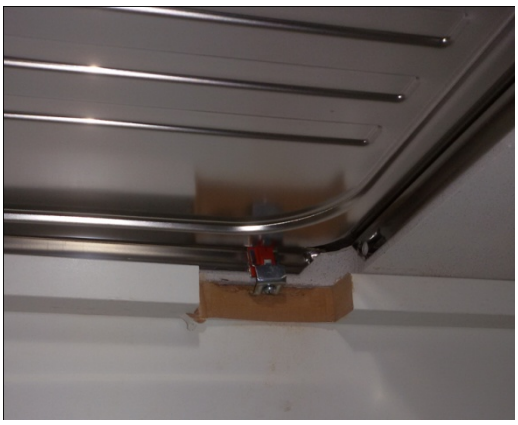

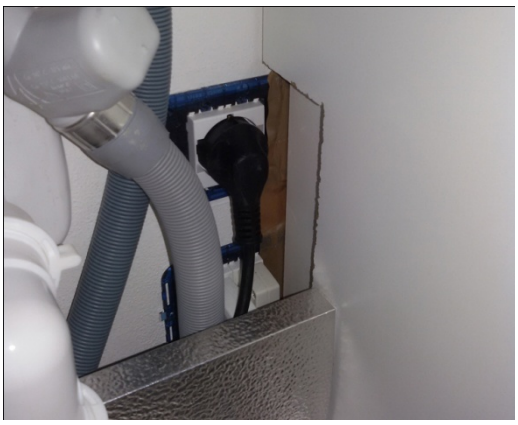

Tutti questi scansi, oltre che antiestetici, visto che non sono verniciati con l'umidità ed il tempo non potrebbero creare dei rigonfiamenti?

5) Angolo gole

Altro aspetto che mi ha creato parecchie perplessità è come è stato gestito l'angolo delle gole.
Io mi aspetto che ci sia un incastro che permetta alle gole di formare un angolo a 90° perfetto, invece mi trovo ad avere le due gole che non sono allineate e combacianti con niente. Ma la cosa secondo me grave è che sono state fissate tra loro internamente con lo scotch bianco, un gommino fermaporta ed una vite.
Immagini esterne, si evincono fessure varie ed irregolari:

Immagini dall'interno, si evince lo scotch, la vite ed il gommino fermaporta:

Avevo notato questa operazione già dopo la prima uscita, e tolto io lo scoth. Alla seconda uscita è stata ripetuta la medesima operazione.
A mio modesto parere non ritengo che questo lavoro rispetti la regola dell'arte.

6) Forno a microonde storto

Il forno a microonde montato sul pensile, sborda nel lato inferiore all'esterno del fianco del pensile stesso, nella parte superiore è all'interno del fianco.

Questo causa due problematiche antiestetiche, la prima è che appunto sborda ed è interno al pensile, la seconda che il forno è storto. Da notare che il forno è stato riposizionato alla seconda uscita, in quanto alla prima era a sua volta storto.

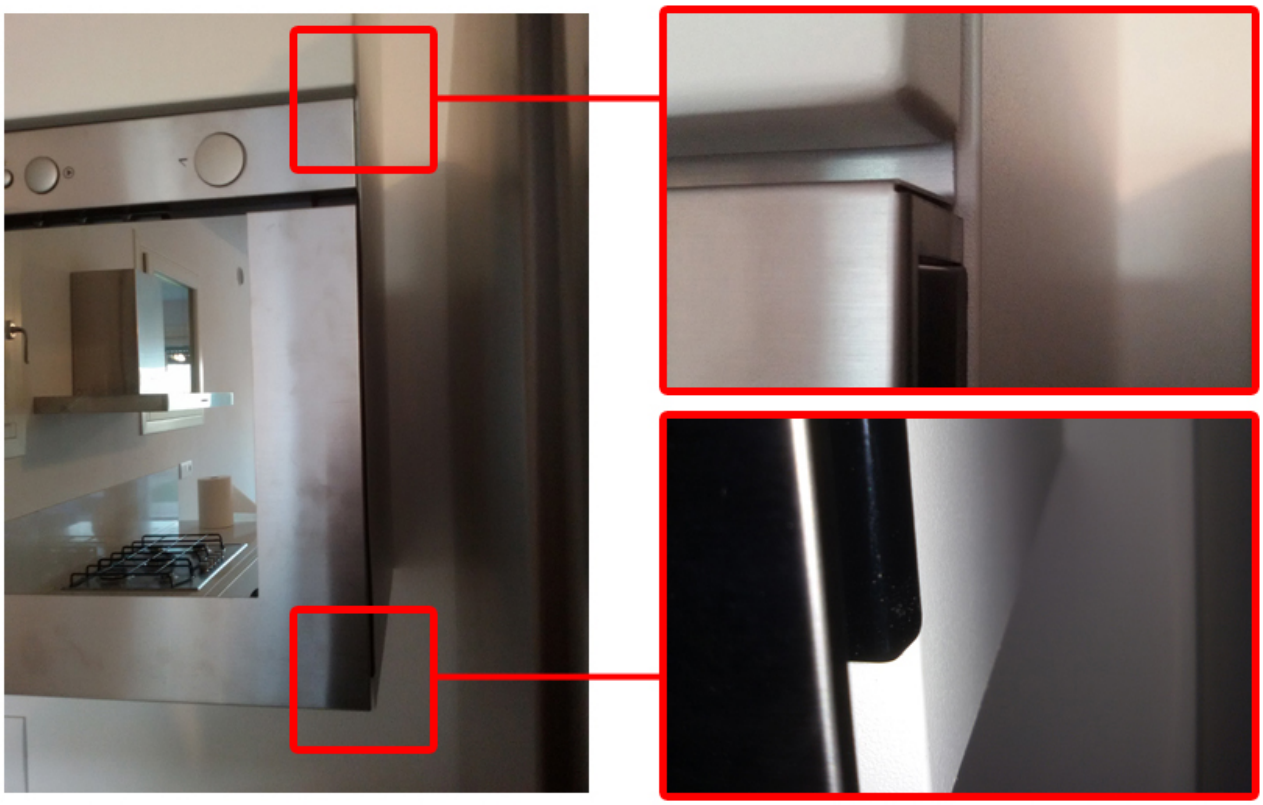

7) Pulizia

Ho notato sul muro sotto al pensile la presenza di manate oltre la normale tolleranza accettabile, oltre allo sporco lasciato all'interno della cappa.

Ovvio che dopo il montaggio di una cucina il cliente deve provvedere autonomamente ai ritocchi del caso, e alla pulizia della cucina, ma denoto una lieve mancanza di professionalità.

Le foto purtroppo rendono poco l'aspetto evidenziato.

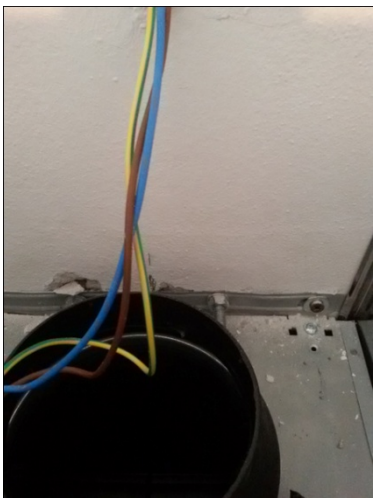

8) Fessura su lavandino

Nonostante sia stata rifatta la siliconatura alla seconda visita, si nota una fessura in un angolo dello scivolo del lavandino. Questo permette sicuramente il passaggio di acqua all'interno del mobile.

Foto dall'esterno:

Foto dall'interno:

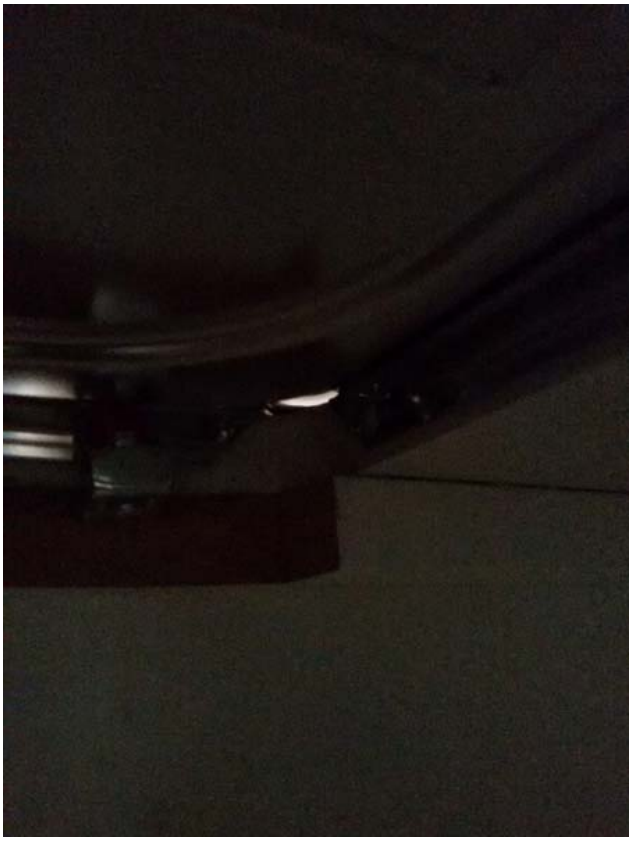

9) Fessura su angolo schienale quartz

L'angolo dello schienale in quartz presenta una fessura.

Tale problematica l'ho condivisa ed accettata al momento dell'istallazione con i montatori.

Mi chiedo però, visti i rilievi e le verifiche dei fuori squadra, se si poteva evitare questa imperfezione.

Osservazioni generali.

10) Forno a microonde con pulsante non centrato

Il forno a microonde ha il pulsante di apertura porta non centrato sul foro.
Premendo il pulsante a fondo ritorna in sede correttamente, mentre non premendolo a fondo ma comunque aprendo la porta, rimane incastrato.

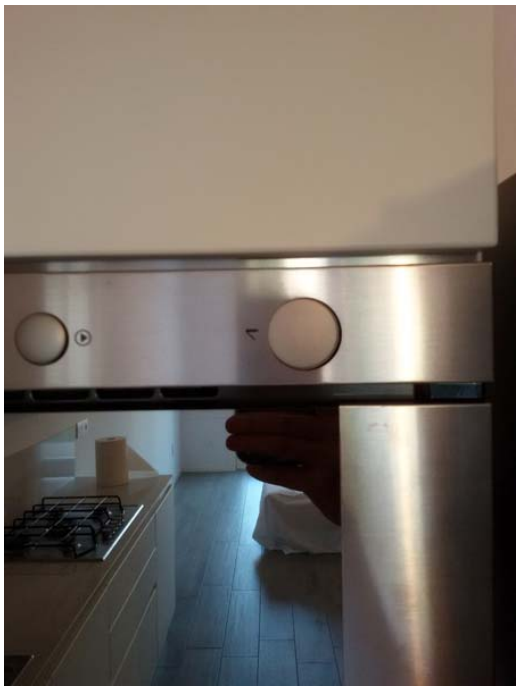

11) Sottoripiano in quartz a vista

La parte inferiore del ripiano in quartz è a vista all'interno del mobile e riporta una scritta di fabbrica.
Non ritengo elegante e fine, seppur in una parte poco visibile, la presenza di tale scritta.

12) Griglia scolapiatti non si incastra

La griglia dello scolapiatti presenta una imperfezione in quanto non si incastra perfettamente.

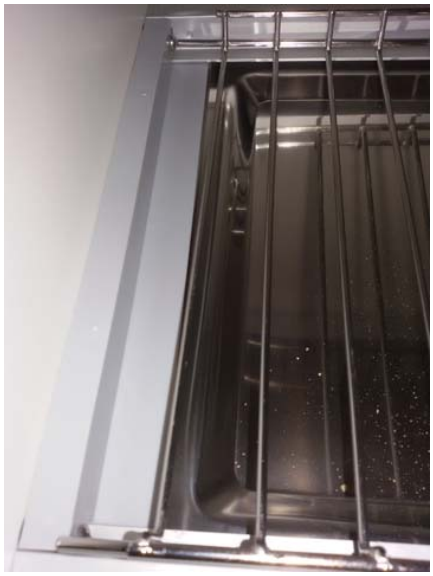

13) Pannello retrostante di dubbia consistenza

Il pannello retrostante i mobili è di una consistenza irrisoria, tale da formare delle “pance” all’altezza del ripiano centrale, specie nel mobile più lungo, da cm. 110.

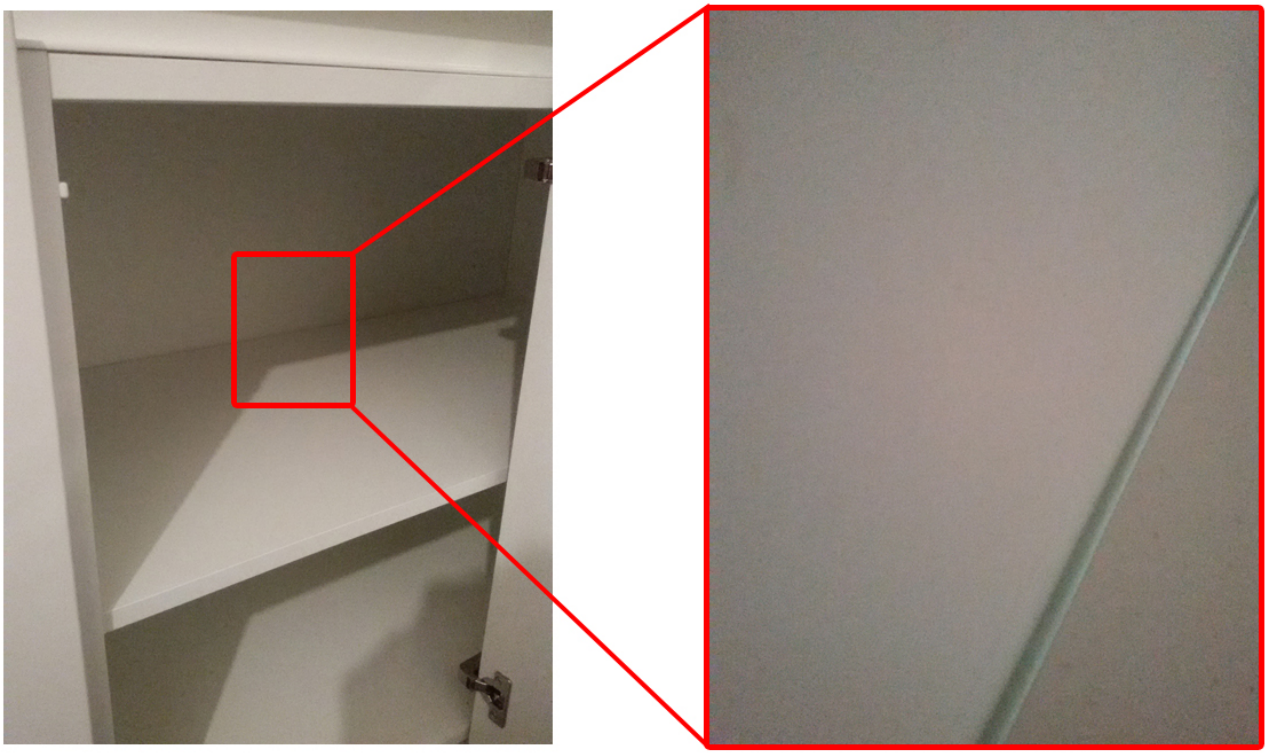

Conclusioni

Date le grandi aspettative che avevo per la cucina scelta, addirittura confermata prima della firma del preliminare, ad una prima vista non c'è nulla da obiettare e la cucina riserva l'aspettato colpo d'occhio, ma osservando nel dettaglio ogni singolo particolare, rimango alquanto deluso.

Non essendo addetto ai lavori, vorrei sapere se tutte le osservazioni che ho sopraelencato sono nella norma e quindi sono io a pretendere troppo o non sono state rispettate le direttive base.
